๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๑๕๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : ☐ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดการชดเชย
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมายังไม่ได้รับรายละเอียดการสร้างอาคารสำนักงานชดเชยจากกรมธนารักษ์
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข : - .....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น /จัดทำผังประมูล	▬	▬	▬									
	▪	▪	▪									
๒.ประสานรายละเอียดการชดเชย				▬	▬	▬	▬	▬	▬			
				▪	▪	▪	▪	▪	▪			
๓.กำหนดมูลค่าชดเชย										▬	▬	▬
รวม												

แผน ▬▬▬▬ ผล ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวัลย์ โหมกจันทึก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒

วันที่รายงาน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๖๒๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๐-๒-๔๘ ไร่

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : ☐ แล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศรับฟังความคิดเห็น กรณีนายประพัทธพงษ์ สุขทธิศิลป์ ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เป็นอาคารแถวอยู่อาศัย ขนาดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง (๔ ห้อง)
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-   .....
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข : -   .....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

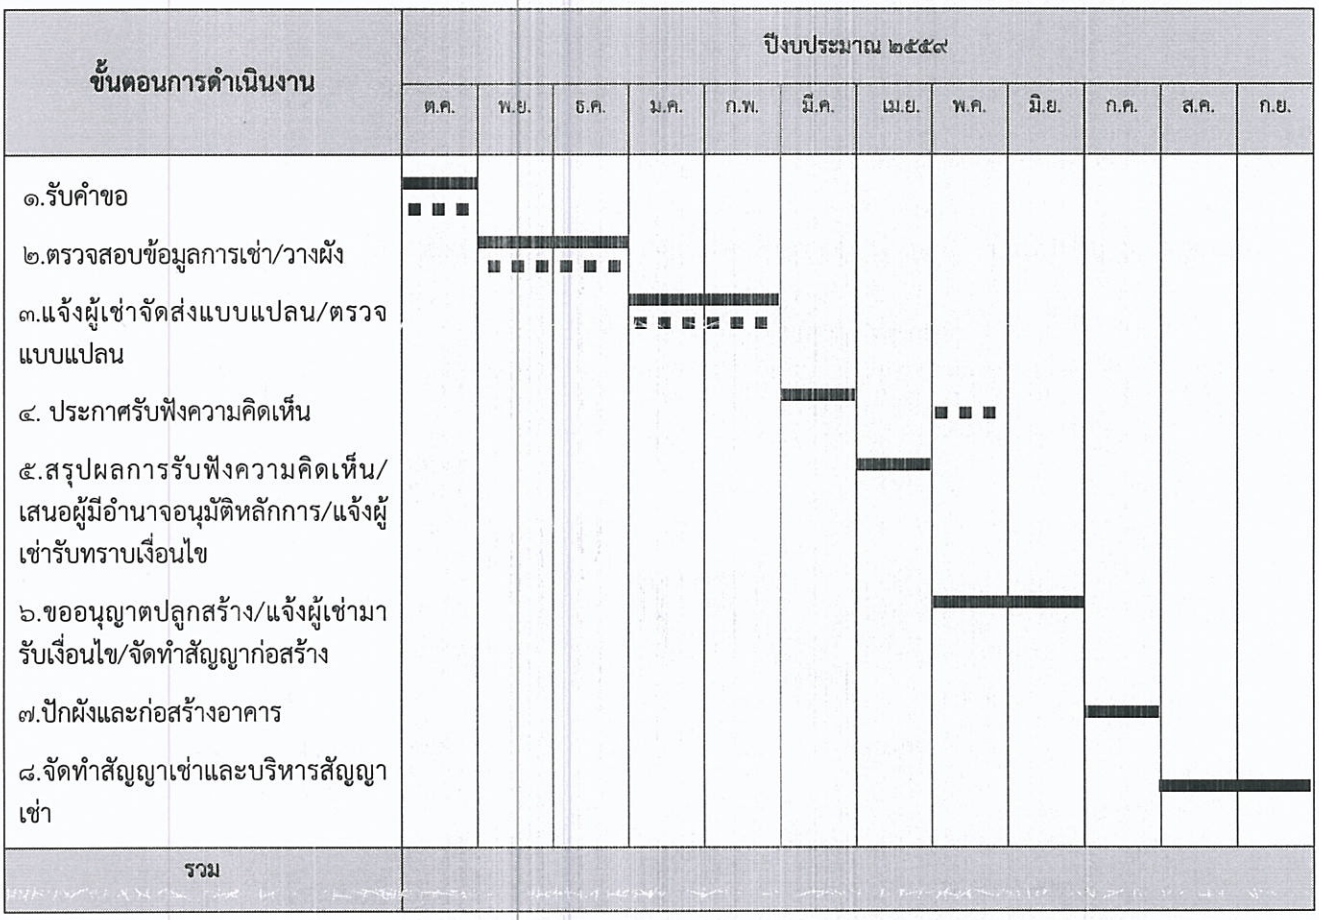

แผน ▬▬▬▬ **ผล** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวมลิวัลย์ โหมกจันทึก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
โทร ๐๔๔-๒๔๓๖๗๒
วันที่รายงาน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
